

Ongeval met verzuim

Factsheet 4

85

Ongevalvrije dagen tot ongeval



SRNL (Projecten)



Meldingsnummer 4392



Meer info?
Dit vind je in de aankomende veiligheidsmemo



Werkzaamheden bestonden uit:

Het plaatsen van betonnen mantelbuizen voor kabels en leidingen onder het ballastbed. Tijdens het aanduwen wordt baddinghout (een stukje hout) gebruikt tussen de graafbak en de mantelbuizen. Een medewerker hield het baddinghout vast waarna zijn duim bekneld kwam te zitten tussen de graafbak en het baddinghout.

Locatie:
Groningen



Baanvak:
Nieuw emplacement "de Vork"


Vergelijkbare incidenten

- Jan 2020
Voet bekneld tussen spoorstaaf en Knijperbak
- Jan 2020
Voet bekneld onder bovenleidingblok
- Nov 2018
Vinger bekneld bij verplaatsen haspel
- Dec 2016
Been bekneld tussen 2 voertuigen



Arborisico:


Knellen en pletten



Slachtoffer heeft:


Duim bekneld. Verwondingen zijn gehecht.

Aantal ongevallen met verzuim

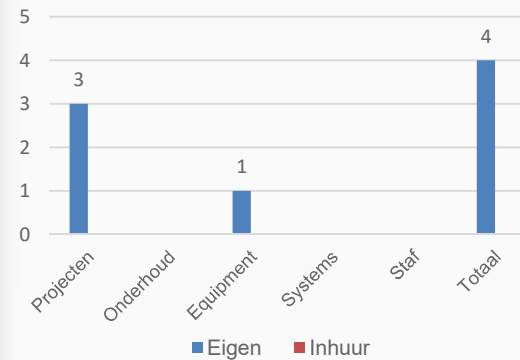


Ongeveldatum

Dinsdag 14 april 2020 – 10:45 uur



Omstandigheden tijdens het incident:



Veilig en gezond uit en thuis

StocoNL
030 240 76 99
En meld....

Stel jezelf de vraag

- Hoe heeft dit ongeval kunnen plaatsvinden?
- Wat is volgens jou de oorzaak?
- Kan dit jou overkomen?
- Heb je een verbeteractie?
